



P R E F E I T U R A D E
SOBRAL

Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos – SE-
COMP

Relatório de Gestão

2017

SUMÁRIO

1 Apresentação	4
2 A SECOMP	4
2.1 Contextualização	4
2.2 Competência Institucional	5
2.3 Estrutura organizacional	5
2.4 Principais clientes e usuários	6
2.5 Principais instalações e localidades.....	6
3 Organograma	7
4 Recursos Humanos.....	8
4.1 Estrutura de servidores.....	9
4.2 Estrutura de terceirizados.....	9
5 Estratégias de Ação	10
5.1 Contexto.....	10
5.2 Objetivos e metas.....	10
6 Resultados da Atuação	10
6.1 Ações realizadas	11
6.1.1 <i>Limpeza Pública Urbana</i>	11
6.1.2 <i>Veículos utilizados para serviços públicos</i>	13
6.1.3 <i>Mutirão de Limpeza Urbana</i>	13
6.1.4 <i>Reduções dos pontos de acúmulo de lixo nas ruas</i>	14
6.1.5 <i>Colocação de Lixeiras Sustentáveis</i>	20
6.1.6 <i>Célula de Iluminação Pública</i>	20
6.1.7 <i>Manutenção da Rede Elétrica</i>	20
6.1.8 <i>Substituição de Luminárias em LED</i>	22
6.1.9 <i>Implantação de aplicativo</i>	25
6.1.10 <i>Célula de Manutenção de Vias e Praças</i>	28
6.1.11 <i>Mobilidade urbana</i>	28
6.1.12 <i>Coordenação de Infraestrutura</i>	33
6.1.13 <i>Obras Públicas e Serviços de Engenharia</i>	34
6.1.14 <i>Obras</i>	34
6.1.15 <i>SIGSECOMP</i>	81
6.2 Síntese da execução orçamentária e financeira	83
6.2.1 <i>Orçamento autorizado, por fonte</i>	83
6.2.2 <i>Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza de Despesa</i>	83
6.2.3 <i>Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos</i>	90

6.2.4 Demonstrativos das Transferências de Recursos mediante Convênio, Ajuste, Acordo, Termo de Parceria ou Outros Instrumentos Congêneres	91
--	----

7 Conclusão.....	93
-------------------------	-----------

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Principais instalações e localidades	6
Tabela 2: Estrutura de cargos em 31/12/2017.....	8
Tabela 3: Estrutura de Servidores em 31/12/2017	9
Tabela 4: Estrutura de terceirizados em 31/12/2017.....	10
Tabela 5: Veículos utilizados para a limpeza urbana.....	13
Tabela 6: Reduções dos pontos de acúmulo de lixo nas ruas.....	15
Tabela 7: Manutenção da iluminação pública do Município	22
Tabela 8: Substituição de luminárias	22
Tabela 9: Modelos de lâmpadas substituídas	22
Tabela 10: Monitoramento do sistema de transporte público.....	29
Tabela 11: Ações da interpostas da gerência de transportes (SECOMP)	31
Tabela 12: Resumo de áreas pavimentadas em 2017	34
Tabela 13: Obras	54
Tabela 14: Obras 2	81
Tabela 15: Orçamento autorizado, por fonte	83
Tabela 16: Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza de Despesa	90
Tabela 17: Fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos	91
Tabela 18: Fluxo financeiro de recursos recebidos ou transferidos (convênios federais)	92
Tabela 19: Execução financeiro de recursos recebidos ou transferidos (convênios federais).....	93

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma da SECOMP	7
Figura 2: Calendário de Coleta na Sede do Município.....	12
Figura 3: Folhetos distribuídos nas residências.....	13
Figura 4: Bairros de Atuação do Mutirão de Limpeza	14
Figura 5: Síntese do Trabalho das Equipes em Campo.....	19
Figura 6: Lixeiras sustentáveis.....	20
Figura 7: Folhetos de iluminação pública.....	21
Figura 8: Luminárias em LED	23
Figura 9: Comparação da iluminação antiga com a nova	25
Figura 10: Imagens do aplicativo #OcupaSobral	27
Figura 11: Equipes de manutenção.....	28
Figura 12: Célula de Gerência de Transportes	30
Figura 13: Gráfico das Ações Gerência de Transportes	32

Figura 14: Novo lay-out dos táxis	33
Figura 15: Telas do SIGSECOMP.....	82

1 APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão** apresenta informações sobre as ações e resultados da **Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos – SECOMP** do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de 2017.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na projeção do resultado alcançado pela **SECOMP**, apresentando a definição de diretrizes e normas relativas ao modelo institucional.

É importante destacar que este documento tem como base tornar transparente as ações realizadas em cada Secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Sobral e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

A primeira sessão apresenta a estrutura da **SECOMP**, com a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional.

Na segunda sessão é exibido o organograma da **SECOMP**.

A terceira sessão trata dos recursos humanos da **SECOMP** e são discriminados o quantitativo de servidores lotados, bem como os terceirizados contratados no órgão.

A quarta sessão aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria, bem como seu planejamento e ações adotadas pela unidade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.

A quinta sessão trata da questão orçamentária da Secretaria. Aqui são expostos os valores recebidos e transferidos, bem como apresenta planilhas com os quantitativos da atuação da Secretaria, possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros.

A sexta e última sessão apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Secretaria, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público.

2 A SECOMP

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos passou a existir a partir da reunião das extintas Secretaria de Obras e Secretarias de Conservação de Serviços Públicos, mais especificamente através da Lei Municipal nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017.

A Secretaria tem como principal característica o cuidado com serviços públicos, a exemplo o que ocorre com a limpeza, mobilidade e iluminação públicas, além da responsabilidade de fiscalizar todas as obras do Município.

2.2 COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL

O art. 26 da referida Lei estipula quais são as atribuições da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, tais quais:

- I. Planejar, elaborar, compatibilizar, coordenar, monitorar e aprovar projetos de infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Sobral;
- II. Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e executar obras de infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Sobral;
- III. Planejar, compatibilizar, aprovar e autorizar a execução de obras públicas nas vias e logradouros;
- IV. Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e controlar as intervenções no sistema de drenagem do Município;
- V. Gerir a produção própria de asfalto;
- VI. Coordenar a relação institucional com órgãos e entidades dos demais entes federados para a execução de obras públicas;
- VII. Realizar perícias e avaliações em bens de interesse público;
- VIII. Articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando a implantação de planos, programas e projetos relativos à infraestrutura;
- IX. Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas;
- X. Planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de transporte público;
- XI. Planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de transporte público urbano;
- XII. Planejar, coordenar, disciplinar, executar e operacionalizar as políticas públicas de limpeza urbana;
- XIII. Planejar, coordenar, disciplinar e orientar a execução e operação das políticas públicas de resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes dos órgãos e entidades públicas ambientais integrantes do SISNAMA;
- XIV. Planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de iluminação pública;
- XV. Planejar, coordenar, orientar, monitorar e executar atividades de conservação de vias públicas;
- XVI. Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em conformidade ao art.2º do Decreto Municipal nº 1.830, de 16 de fevereiro de 2017, a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos é a seguinte:

- I. Direção Superior
 1. Secretário.
- II. Assessoramento

1. Assessoria Técnica;
2. Assessoria Jurídica.
- III. Execução Programática
 1. Coordenadoria de Infraestrutura;
 - 1.1. Célula de Projetos e Orçamento;
 - 1.2. Célula de Fiscalização;
 - 1.3. Célula da Usina de Asfalto.
 2. Coordenadoria de Mobilidade;
 - 2.1. Célula de Transporte;
 - 2.2. Célula de Infraestrutura Viária e Acessibilidade;
 - 2.3. Célula de Monitoramento do Sistema;
 3. Coordenadoria de Serviços Públicos;
 - 3.1. Célula de Limpeza Urbana;
 - 3.2. Célula de Iluminação Pública;
 - 3.3. Célula de Serviços Regionais;
 - 3.4. Célula de Manutenção de Vias e Praças;
 - 3.5. Célula de Gestão de Cemitérios;
 - 3.6. Célula de Gestão de Aterro Sanitário.
- IV. Execução Instrumental
 1. Coordenadoria de Administrativo-financeiro;
 - 1.1. Célula de Gestão de Contratos e Convênios.
- V. Conselhos Municipais
 1. Conselho Municipal de Transportes.

2.4 PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos tem como seus serviços originários a prestação de serviços básicos e essenciais para população sobralense, tais quais limpeza pública do Município e a manutenção da rede elétrica das ruas e avenidas da Cidade, a regulamentação e fiscalização do sistema de transporte público do Município e responsável pelo investimento do Município por meio da fiscalização das obras públicas, além da melhoria e desenvolvimento da infraestrutura básica da população no âmbito geral.

2.5 PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES

Unidade	Endereço
Aterro Sanitário	CE XXX – KM XX
Usina de Asfalto	CE XXX – KM XX
Paço Municipal	Av. Viriato de Medeiros – 1250 – Centro – 3º andar

Tabela 1: Principais instalações e localidades

3 ORGANOGRAMA

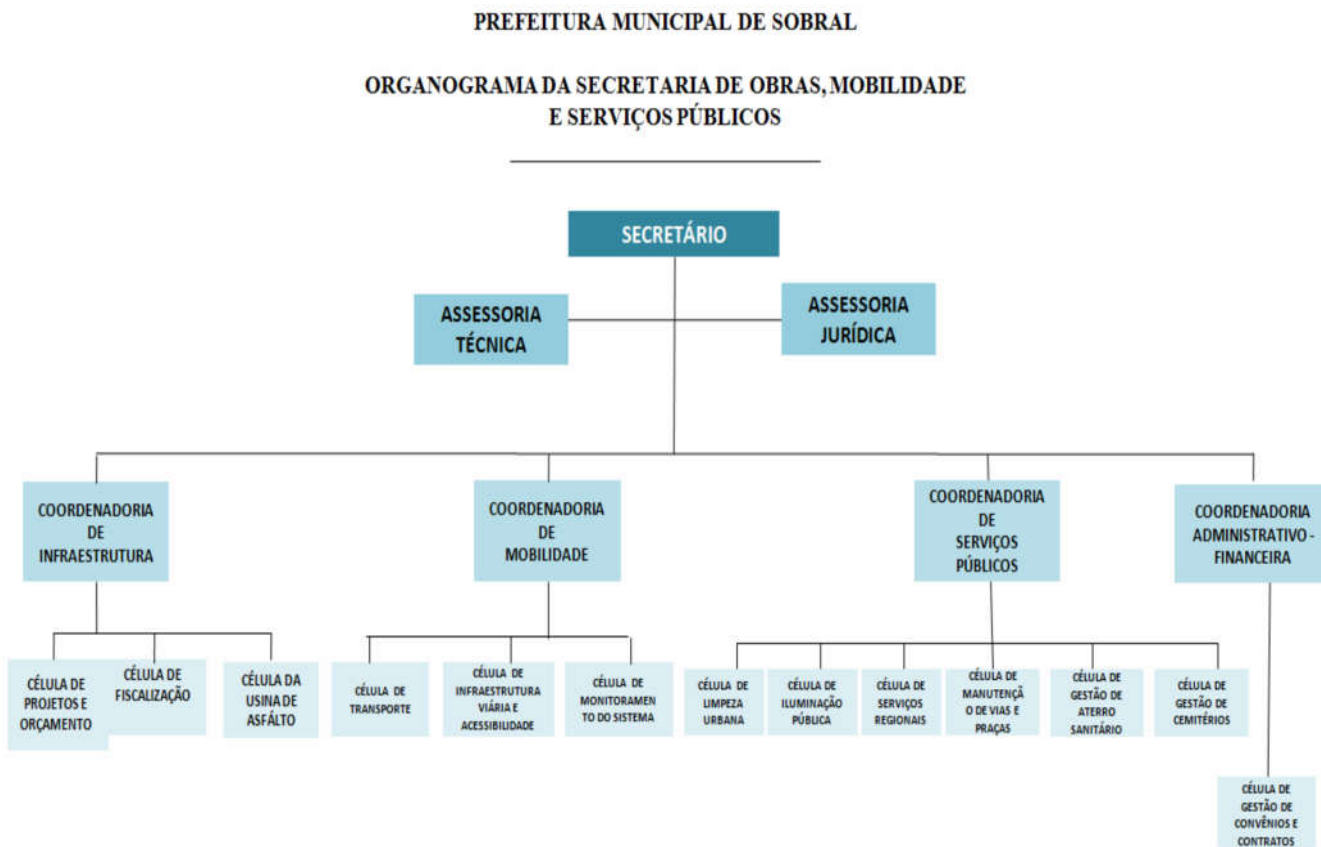


Figura 1: Organograma da SECOMP

4 RECURSOS HUMANOS

A estrutura de recursos humanos que atua na **SECOMP** distribuída e categorizada conforme tabelas abaixo:

Cargos	Na Estrutura	Ocupados
Efetivos	27	27
Operário – 8horas	03	03
Operário – 4horas	02	02
Motorista – 8 horas	04	04
Serventes – 8 horas	03	03
Serventes – 4 horas	01	01
Aux. De Serviços diversos	01	01
Agente administrativo – 8 horas	05	05
Aux. Serviços Gerais - 8 Horas	02	02
Gari - 4 Horas	03	03
Gari - 8 Horas	01	01
Telefonista – 8 horas	01	01
Programador	01	01
Comissionados	48	48
Secretário	01	01
Coordenador (Direção de Nível Superior 2)	05	05
Gerentes (Direção de Nível Superior 3)	12	12
Assessoria Técnica I	28	28
Assessoria Técnica II	01	01
Assistente Municipal De Obras	01	01
Efetivos / Comissionados	03	03
Gerentes (Direção de Nível Superior 3)	01	01
Fiscal De Urbanismo E Meio Ambiente Classe I	01	01
Assistente Técnico I Das-1	01	01
Total Geral	78	78

Tabela 2: Estrutura de cargos em 31/12/2017

4.1 ESTRUTURA DE SERVIDORES

Descrição	Quantidade
Efetivos	27
Efetivos / Comissionados	3
Cedidos	1
Comissionados	47
Total	78

Tabela 3: Estrutura de Servidores em 31/12/2017

4.2 ESTRUTURA DE TERCEIRIZADOS

Descrição	Quantidade
MECÂNICO	2
ELETRICISTA	5
SERVEnte	25
PEDREIRO	32
JARDINEIRO	68
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	1
SUPERVISOR DE SERVIÇO	2
TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1
GARI DE VARRIÇÃO	253
GARI DE COLETA	68
Total	457
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
MOTORISTA - 01 ATE 09 LUGARES	
MOTORISTA - ATÉ 11 t	5
MOTORISTA - DE 12 t ATÉ 18T	5
MOTORISTA - ACIMA DE 18 t	8
MOTORISTA GABINETE I	1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1
TRATORISTA DE PNEU	2
SUPERVISOR DE SERVIÇO	22
AUXILIAR TECNICO	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2

Descrição	Quantidade
ALMOXARIFE	1
Total	57

Tabela 4: Estrutura de terceirizados em 31/12/2017

5 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

5.1 CONTEXTO

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, durante o ano de 2017, teve a preocupação de tomar medidas preventivas para que não houve agravamento de nenhum dos serviços pelos quais é de sua responsabilidade cuidar.

A título de exemplo, antecipou-se e realizou, durante dois meses, um mutirão de limpeza em praticamente toda a sede do Município. Da mesma forma, a Secretaria realizou processo de cadastramento dos permissionários do sistema de táxi e deu início ao processo de cadastramento dos mototaxistas, além do início da análise do Edital a ser lançado para as linhas de ônibus a serem implantadas em Sobral.

Em relação às obras, a Secretaria providenciou, dentre outras medidas, a criação de um sistema eletrônico que funciona 24 horas e dá absoluta transparência para todos os passos das obras públicas do Município de Sobral. É um marco na história das obras do Município.

5.2 OBJETIVOS E METAS

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos estipula como algumas de suas metas para 2018 a melhoria e o desenvolvimento da mobilidade urbana do Município, ocasião em que terá totalmente organizados os sistemas de táxi e mototáxi da cidade, além do funcionamento, pela primeira vez na história do Município, de linhas de ônibus modernos e que possibilitem a utilização segura e eficaz do transporte.

Igualmente, conseguir fazer funcionar o sistema (SIGSECOMP) é uma das metas da SECOMP, considerando, sobretudo, a dificuldade dos contratados pelo Município na utilização de sistemas inovadores tal qual é o SIGSECOMP.

Não deixar com que obras fiquem paralisadas; seguir cronogramas físico-financeiros; economizar com atitudes de eficiência na iluminação pública; etc., também são metas da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos.

6 RESULTADOS DA ATUAÇÃO

Os resultados da atuação da **Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos** são analisados sob a perspectiva ótica das atividades realizadas em cada uma das áreas finalísticas e de apoio, bem como em observância aos aspectos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial.

6.1 AÇÕES REALIZADAS

6.1.1 Limpeza Pública Urbana

A Limpeza Pública do município é realizada através de uma Coleta Sistemática porta a porta com atendimento em todos os bairros e distritos do município de Sobral. De acordo com o IBGE, Sobral conta com uma população estimada de 205.529 pessoas, distribuídas nos 37 bairros da sede e 16 distritos e localidades. A Limpeza Pública é realizada seguindo um calendário de coleta que proporcionam sistema eficiente de limpeza para o cidadão, a fim de evitar proliferação de doenças, animais e insetos, causadas por acúmulo de lixo, em residências e ruas e avenidas do município. A coleta de lixo é o serviço básico principal exercido pela Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, e os benefícios trazidos por ela, proporcionam a melhoria e manutenção na qualidade de vida de toda a população, e dando uma destinação final aos Resíduos sólidos ao Aterro Sanitário do Município, para diminuir e evitar o impacto do lixo ao meio Ambiente e a saúde da população Sobralense.

CALENDÁRIO DA COLETA SISTEMÁTICA



FIQUE ATENTO PARA OS DIAS E HORÁRIOS DE COLETA manhã tarde

SEGUNDA | QUARTA | SEXTA

Derby	Parque Silvana II	Distrito Industrial
Pedrinhas	Morada dos Ventos I e II	Alto da Brasília
Dom Exedito	Vila Recanto I e II	Coração de Jesus
Boa Vizinhaça	Residencial Meruoca	Santa Casa
Exedito	Cohab I e II	Tamarino
Parque Silvana I	Parque Jatobá I e II	Cesário Barreto
Colina	Santo Antônio	Betânia
Campo dos Velhos	Gerardo Cristino	Sinhá Sabóia

TERÇA | QUINTA | SÁBADO

Campo dos Velhos	Renato Parente	Margem Esquerda
Junco	Bairro Dom José	Nova Caiçara
Cohab III	Sem Terra	Domingos Olímpio
Vila União	Conj. Pe. Zé Linhares	Padre Ibiapina
Grajaú	Padre Palhano	Sumaré
Terrenos Novos	Áreas próximo ao Arco	Alto do Cristo
Cid. José Euclides I e II	Hospital Dr. Estevão	Coelce

DIARIAMENTE • CENTRO • HORÁRIO DA COLETA: MANHÃ E NOITE. INCLUSIVE FERIADOS E DIAS SANTOS.

3677.1177

www.sobral.ce.gov.br

PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62.011-060 - Sobral - CE

Figura 2: Calendário de Coleta na Sede do Município



Figura 3: Folhetos distribuídos nas residências

Calendário distribuído nas residências de Sobral, para acompanhamento correto da coleta sistemática porta a porta, assim o evitando acúmulo de lixo nas ruas e avenidas da cidade.

6.1.2 Veículos utilizados para serviços públicos

Tipo de veículo	Quantidade
Compactadores locados	04
Compactadores PMS	09
Caçambas Basculantes para Coleta Porta à Porta	14
Caminhões de Rama	02
Ônibus Para Transportes de na Sede e Distritos	02
Motos para Fiscalização	06
Saveiros	03
Total	40

Tabela 5: Veículos utilizados para a limpeza urbana

6.1.3 Mutirão de Limpeza Urbana

No ano de 2017, a SECOMP realizou mutirão de Limpeza Urbana, que atendeu a cidade como um todo através de contratação de uma força tarefa de 400 operários durante o mês de junho e 200 operários no mês de julho de 2017, que se dividiram em 4 equipes de 100 operários. Foram realizadas limpezas em todos os bairros de Sobral.

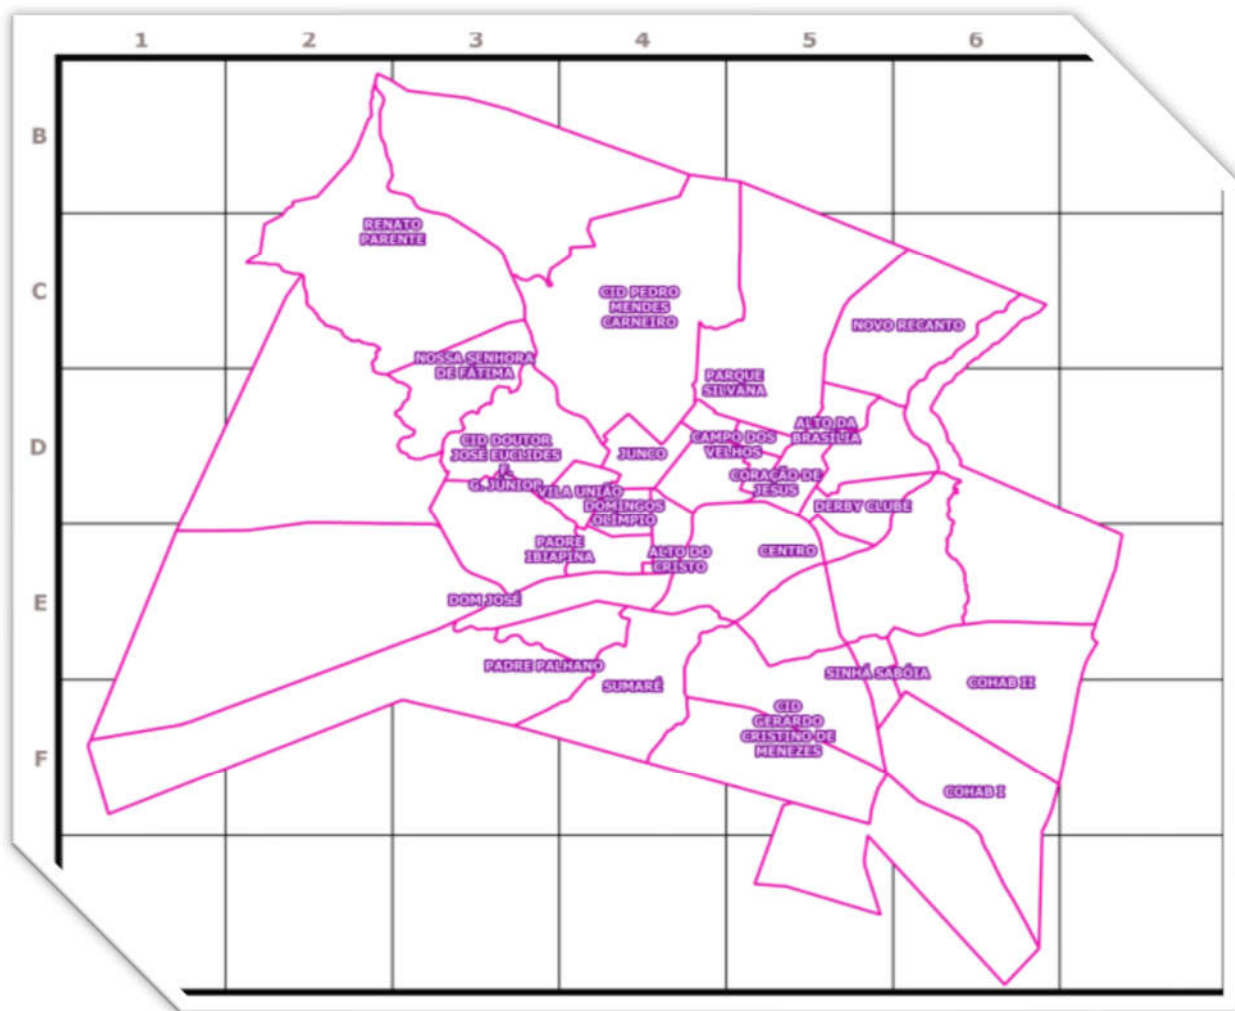


Figura 4: Bairros de Atuação do Mutirão de Limpeza

6.1.4 Reduções dos pontos de acúmulo de lixo nas ruas

Bairro	Quantidade inicial	Quantidade final	Redução (%)
Domingos Olímpio	33	17	48.48%
Junco	17	11	35.29%
Campo dos Velhos	23	20	13.04%
Cohab I	5	3	40%
Jatobá	0	0	
Padre Palhano	11	9	18.18%
Derby Clube	8	5	37.5%
Distrito Industrial	0	0	
Cohab II	24	15	37.5%

Bairro	Quantidade inicial	Quantidade final	Redução (%)
Dom Expedito	9	9	0%
Novo Recanto	4	2	50%
Pedrinhas	2	2	0%
Jardim	0	0	
Alto da Brasília	19	15	21.05%
Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior	11	7	36.36%
Vila União	8	6	25%
Juazeiro	0	0	
Centro	32	23	28.12%
Dom José	24	23	4.166%
Alto do Cristo	23	17	26.08%
Cidade Pedro Mendes Carneiro	13	10	23.07%
Jerônimo de Medeiros Prado	2	2	0%
Padre Ibiapina	38	19	50%
Mucambinho	0	0	
Renato Parente	19	12	36.84%
Bairro das Nações	0	0	
Sumaré	14	12	14.28%
Expectativa	5	5	0%
Várzea Grande	0	0	
Cidade Gerardo Cristino de Menezes	24	19	20.83%
Nossa Senhora de Fátima	3	1	66.66%
Doutor Juvêncio de Andrade	4	4	0%
Cachoeiro	0	0	
Parque Silvana	1	0	100%
Edmundo Monte Coelho	0	0	
Coração de Jesus	9	7	22.22%
Sinhá Sabóia	6	4	33.33%
TOTAL	391	279	71,36%

Tabela 6: Reduções dos pontos de acúmulo de lixo nas ruas









Figura 5: Síntese do Trabalho das Equipes em Campo

6.1.5 Colocação de Lixeiras Sustentáveis



Figura 6: Lixeiras sustentáveis

6.1.6 Célula de Iluminação Pública

Um Serviço básico de suma importância e essencial para a melhoria na qualidade de vida do cidadão, proporcionando uma melhora em todos os âmbitos do convívio social e a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos se faz atuante para cada vez mais proporcionar uma melhoria no fornecimento dos serviços, pois sua manutenção tem repercussão direta no funcionamento e é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. No mais, além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer.

6.1.7 Manutenção da Rede Elétrica

A Manutenção da Rede Elétrica do município é feita através de uma empresa privada, selecionada através de Licitação (Concorrência Pública), na qual a gestão e fiscalização do contrato e da prestação dos serviços fica a cargo da SECOMP, tendo em vista a urgência do serviço e o atendimento a demanda da população sobralense. O serviço conta com uma Central de Atendimento ao Consumidor através de um Disk Serviços, um 0800 no qual a população pode comunicar a necessidade de manutenção da rede gratuitamente, e que o através da ligação e gerado um protocolo que a empresa tem um prazo máximo de 72 horas para atendimento e resolução do problema. O cidadão pode fazer o acompanhamento do serviço através do número de protocolo, comunicando a Prefeitura caso a solicitação não tenha sido tempestivamente atendida.

Cidadão de Sobral, para registro de reclamação de lâmpada apagada à noite ou acesa durante o dia e para receber relatos de roubo de cabos de iluminação, **LIGUE GRÁTIS** para o serviço de atendimento de iluminação pública e **INFORME O ENDEREÇO** que necessita de reparos.

Você morador de Sobral ligue

0800

727 71 73*

e solicite nossos serviços



A Prefeitura de Sobral, junto com a CITELUM, está melhorando a iluminação pública de onde você mora. Deixando seu bairro mais iluminado e seguro!



SOBRAL
PREFEITURA
CADA VEZ MAIS HUMANA



COMO SOLICITAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA?

Quando alguma luminária de sua rua não estiver funcionando, estiver acesa de dia ou apagada à noite...

...ligue grátis para o serviço de atendimento de iluminação pública **0800 727 7173** e informe o endereço do local que necessita de reparos.

A Prefeitura de Sobral, junto com a CITELUM, está melhorando a iluminação pública de onde você mora. Deixando seu bairro mais iluminado e seguro!

Todos os funcionários da Citelum trabalham uniformizados.

Roubar ou degradar postes, luminárias e cabos de iluminação pública é crime. Não deixe que vândalos estraguem as ruas de seu bairro, denuncie e ligue para 0800 727 7173 ou 190 (Polícia).



Saiba como você ajuda a manter sua cidade iluminada






Figura 7: Folhetos de iluminação pública

Os serviços proporcionam conforto, agilidade e eficiência na identificação de pontos defeituosos, e na resolução do problema, assim como o acompanhamento do cidadão aos serviços prestados.

Ação	Quantidade
Serviços	7.922
Solicitações atendidas de janeiro a dezembro de 2017	7.811
Obras de Ampliação de Rede realizadas	111
Peças substituídas nas manutenções	9.309

Ação	Quantidade
Reatores	2.027
Relés	2.880
Lâmpadas	4.402

Tabela 7: Manutenção da iluminação pública do Município

6.1.8 Substituição de Luminárias em LED

Um dos serviços mais inovadores da SECOMP no ano de 2017, quando se trata de Iluminação Pública, foi a substituição de Luminárias de Vapor de Sódio, por luminária em LED Bairros Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes (Terrenos Novos) e Vila União. A modernização dessas Luminárias Proporciona uma evolução no conceito de iluminação, pois o custo benefício repercute em todos os âmbitos, tanto nos gastos públicos, pois tem a redução de pelo menos 25% no custo da iluminação, como na melhoria na qualidade de vida, proporcionando uma iluminação de avenidas, ruas e passeios mais eficiente e limpa, frisando também a maior vida útil dos equipamentos.

Ação	Quantidade
Serviços	
Luminárias Substituídas até dezembro de 2017	227
Projeção para 2018	Em estudo
Dados financeiros	
Valor licitado	673.715,01
Valor executado em 2017	162.213,18

Tabela 8: Substituição de luminárias

Lâmpadas antigas (potência)	Lâmpadas novas (potência)
Vapor de sódio (70W)	LED (58W)
Vapor de sódio (150W)	LED (114W)
Vapor de sódio (250W)	LED (180W)

Tabela 9: Modelos de lâmpadas substituídas



Figura 8: Luminárias em LED





Figura 9: Comparação da iluminação antiga com a nova

6.1.9 Implantação de aplicativo

O desenvolvimento do Aplicativo, com o Nome Provisório de #OcupaSobral, foi uma das maiores inovações tecnológicas da SECOMP em 2017. O projeto piloto deverá ser implantado no início de 2018, para servir de canal de comunicação entre munícipe e Prefeitura, tendo em vista a facilidade nas solicitações dos serviços públicos do município. No aplicativo o cidadão sobralense poderá informar à Prefeitura, problemas existentes na sua região ou no seu trajeto. Veja os benefícios da implantação do aplicativo:

- Definição:
 - Facilitar aos munícipes a comunicação de necessidades de serviço públicos.
- Serviços atendidos:
 - Iluminação Pública;
 - Limpeza Pública;
 - Manutenção de Vias e Praças.

- Benefícios:
 - Para Prefeitura:
 - Maior interação prefeitura munícipes;
 - Levantamento de estatísticas;
 - Direcionamento de ações sociais;
 - Melhoramento de coletas;
 - Rapidez no atendimento das demandas.
 - Para o Município:
 - Desconto em multas municipais;
 - Desconto em IPTU;
 - Entradas para eventos no teatro e cinemas;
 - Fazer parcerias para conseguir mais benefícios.
- Futuros:
 - Desafios de Check-in;
 - Interação com outras secretarias.




Figura 10: Imagens do aplicativo #OcupaSobral

6.1.10 Célula de Manutenção de Vias e Praças

A equipe de Manutenção de vias e praças, atua na manutenção de vias realizando pequenos reparos, sendo eles:

- Recuperação e limpeza de rede de drenagem/esgoto;
- Execução de boca de lobo;
- Recuperação de passeios do Centro Histórico;
- Execução e recuperação de calçamento (sextavado, tipo tijolinho, CITPLAC e pedra portuguesa);
- Execução de piso intertravado.



Figura 11: Equipes de manutenção

6.1.11 Mobilidade urbana

Mais um serviço que se mantém sob a gestão da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, que através de seus servidores e agentes de fiscalização buscam a melhoria dos serviços prestados à população de Sobral, distritos e localidades e cidades circunvizinhas, através serviços variados, que são fiscalizados e coordenados, através de leis municipais, decretos e portarias, que buscam sempre um serviço de qualidade que proporcione um serviço público equalizado a todos os usuários que o utilizam. Os serviços que estão sob a gestão da SECOMP, são os de transporte de passageiros através de Serviços de Taxis e

Moto taxi, que se adéquam a uma legislação específica do município e que seguem os padrões adotados nas cidades de grande porte, visando sempre o crescimento e evolução desses serviços para proporcionar a locomoção da população sobralense dentro dos centros urbanos e regiões metropolitanas de Sobral, assim como micro-ônibus que atuam em horários e rotas específicas para transportes de cidadãos de bairros periféricos ao centro da cidade.

6.1.11.1 Célula de Monitoramento do Sistema

A atuação da célula de monitoramento do sistema ocorre semanalmente nas ruas de Sobral, atuando também em pontos específicos da cidade, por meio de sua equipe de fiscais, que atuam no modo itinerante e fixo, de acordo com os pontos previamente determinados de paradas e de embarque e desembarque de passageiros, atuando sempre de acordo com a Lei nº 1354, de 11 de março de 2014, que instituiu e regulamenta o serviço público de transporte individual de passageiro, modalidade táxi. Da mesma forma, os seguintes dispositivos: Lei nº 12.0 de 29 de julho de 2009, portaria nº 001/99 de 01 de março de 1999; Lei nº 1048 de 15 de dezembro de 2010, decreto nº 1713, de 27 de novembro de 2015 e lei nº 140 de 25 de outubro de 1997, dos serviços de moto táxi, que faz o regimento dos permissionários do transporte Públicos Sobralense.

Ação	Quantidade
Blitz	
Abril a dezembro de 2017	73
Resultados	
Número de Batas recolhidas	18
Veículos apreendidos e conduzidos ao DETRAN-CE	45
Notificações e Autuações aplicadas	125

Tabela 10: Monitoramento do sistema de transporte público



Figura 12: Célula de Gerência de Transportes

6.1.11.2 Levantamento de ações

A SECOMP, por intermédio da Gerência de Transportes, realizou levantamento dos dados de todas as ações interpostas por este setor desde o dia 01 de junho de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017. Foram emitidas e fornecidas o total de 3.493 Autorizações/Declarações direcionadas aos diversos serviços ofertados pela Gerência, conforme pode ser visto abaixo.

Serviços solicitados	Quantidade	%
Prorrogação de jornada	489	14,00 %
Autorização para licenciamento mototaxi	652	18,67 %
Autorização para licenciamento táxi	179	5,12 %
Férias (mototaxi)	323	9,25 %

Serviços solicitados	Quantidade	%
Adesivo	216	6,18 %
Afastamento por motivo de doença	40	1,15 %
Isenção de ipva - mototaxi	312	8,93 %
Isenção de ipva - taxi	186	5,32 %
Isenção de ipi & icms	76	2,18 %
Declarações diversas	432	12,37 %
Alvará distrital	72	2,06 %
Autorização para licenciamento distrital	37	1,06 %
Alvará de táxi	200	5,73 %
Processos indeferidos	79	2,26 %
Autorização para instalação de taxímetro	200	5,73 %
Total	3.493	100%

Tabela 11: Ações da interpostas da gerência de transportes (SECOMP)

Foram emitidas e fornecidas o total de 3.493 Autorizações/Declarações direcionadas aos diversos serviços ofertados pela Gerência.

A fim de obtermos um melhor diagnóstico dos dados levantados, mostraremos logo abaixo os resultados em gráficos, com suas respectivas porcentagens incididos sobre o total de serviços solicitados pelos usuários do serviço.




Figura 13: Gráfico das Ações Gerência de Transportes

Fonte: Elaborado pela Gerência (2017)

6.1.11.3 Recadastramento dos permissionários de táxi

A SECOMP realizou entre os dias 07 e 18 de agosto de 2017, o processo de recadastramento que visa manter regularizados os permissionários do serviço de Táxi do Município de Sobral, conforme dispõe a lei 1354 de 11 de março de 2014.

6.1.11.4 Novo layout dos táxis

Desenvolvido novo Layout aos táxis da Cidade de Sobral, melhorando e dando maior visibilidade aos automóveis, além disso, ajudar a diminuir a poluição visual que era eminente antes desse novo modelo.



Figura 14: Novo lay-out dos táxis

6.1.11.5 Instalação dos taxímetros

A partir do dia 29 de janeiro de 2018, em parceria com o INMETRO, começarão a ser instalados os Taxímetros em todos os permissionários do sistema de táxi aptos no recadastramento. Essa ação dará maior transparência do serviço aos usuários do sistema de transporte público desta modalidade.

6.1.11.6 Abertura de processo licitatório para aquisição de coletes de seguranças (batas) moto taxistas.

A SECOMP por intermédio da Gerência de Transportes e Assessoria Jurídica encaminhou ao setor de LICITAÇÃO, pedido de processo licitatório para aquisição de 753 coletes de segurança para todos os permissionários da modalidade Moto táxi no Município de Sobral-CE.

6.1.12 Coordenação de Infraestrutura

6.1.12.1 Usina de Asfalto

Usina de Asfalto do Município de Sobral dispõe de um Equipamento de Tecnologia de Ponta, com capacidade de Produção de asfalto de 550 ton./dia, sendo um dos equipamentos mais avançados do Estado do Ceará, a célula de usina de asfalto no ano de 2017 foi responsável por um serviço de recapeamento asfáltico que abrangeu avenidas e ruas de bairros e distritos de sobral.

Mês	Total de asfalto carregado (T)	Total de área asfaltada (m²)
Junho	1.861,76	22.775,00
Julho	1.298,36	14.947,70
Agosto	1.824,94	28.095,05
Setembro	2.074,52	22.839,00
Outubro	3.076,34	34.044,10
Novembro	1.091,65	17.076,20
Dezembro	1.272,77	10.690,80
Total Anual	12.500,34	150.467,85

Tabela 12: Resumo de áreas pavimentadas em 2017

6.1.13 Obras Públicas e Serviços de Engenharia

As principais atividades da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura. As Obras Públicas realizadas pela SECOMP proporcionam melhorias na qualidade de vida da população sobralense, pois ela consiste no melhor investimento do município em:


- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de esgoto na sede e distritos de Sobral;
- Obras de drenagem de águas pluviais;
- Pavimentação em pedra tosca nos distritos e sede do Município;
- Pavimentação de passeios na sede do Município;
- Pavimentação asfáltica em avenidas e ruas da cidade através da sua Usina de Asfalto;
- Pontes e passagens molhadas em logradouros;
- Abertura de estradas vicinais;
- Ampliação da infraestrutura hídrica;
- Perfuração de instalação de poços profundos que levam acesso a água potável a uma parcela da população.




6.1.14 Obras


Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
Obras Municipais - Recursos Estaduais					
42	CONTRATO 026/2014-SEBRAS	CONVÊNIO 018/2014/DER/PMS - REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	R\$ 2.773.059,92	EM ANDAMENTO	0,0




Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
31	CP 006/2016 - R\$ 1.707.584,87 - LOTE 1	CONST. PAV PEDRA TOSCA LOGRADOUROS SEDE E DISTRITOS - LOTE I	R\$ 378.998,71	EM ANDAMENTO	14,56%
36	CP 007/2016 - R\$ 1.915.811,62 - LOTE 1	CONST. PAV PEDRA TOSCA LOGRADOUROS SEDE E DISTRITOS - LOTE I	R\$ 340.681,96	EM ANDAMENTO	14,56%
32	CP 006/2016 - R\$ 1.707.584,87 - LOTE 2	CONST. PAV PEDRA TOSCA LOGRADOUROS SEDE E DISTRITOS - LOTE II	R\$ 337.270,59	EM ANDAMENTO	14,56%
26	CP 005/2016 - R\$ 1.745.306,26 - LOTE 1	CONST. PAV PEDRA TOSCA LOGRADOUROS SEDE E DISTRITOS - LOTE I	R\$ 577.870,13	EM ANDAMENTO	14,92%
27	CP 005/2016 - R\$ 1.745.306,26 - LOTE 2	CONST. PAV PEDRA TOSCA LOGRADOUROS SEDE E DISTRITOS - LOTE II	R\$ 422.813,08	EM ANDAMENTO	14,56%




Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
9	098/2016 SE-BRAS CPL	PERFURAÇÃO DE POÇOS/ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALEGRE	R\$ 42.022,15	EM ANDAMENTO	100,00%
					
Obras Municipais - Recursos Federal					
ITEM	CONTRATO Nº	OBJETO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO
17	0062013-1	IMPLANTACAO DE REDE DE MICRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE SOBRAL CE (DRENAGEM A E B VILA UNIÃO)	R\$ 1.085.250,85	EM ANDAMENTO	64,93%
20	011/2011	PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, CALÇADAS EM VÁRIOS BAIROS PT-0347730-63	R\$ 1.468.940,16	EM ANDAMENTO	

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
46	004/2014	CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS PT-0316170-42	R\$ 351.312,84	EM ANDAMENTO	
14	TP Nº 019/2016	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARÁ	R\$ 357.104,65	EM ANDAMENTO	100,00%
					
15	002/2012	ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO SES SOBRAL LIGACOES INTRADOMICILIARES LIGA PREDIAIS REDE COLETORA ELEVATORIAS E ETE	R\$ 528.986,46	EM ANDAMENTO	53,77%
<p>OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO SES DE 12 (DOZE) BAIRROS DE SOBRAL e ETE – PT Nº 0351172-91. CONTRATO: 023/2017 – SECOMP. EMPRESA EXECUTORA: SANEBRÁS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. ORIGEM DOS RECURSOS: CAIXA ECONÔMICA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 444.105,00. TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 238.781,57 (53,77%). PRAZO CEF: 30/03/2018 PRAZO PMS: 10/06/2018 SITUAÇÃO DO OBJETO: EM ANDAMENTO</p>					
16	3171201/2007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CENTRO E PEDRINHAS PT Nº 0222721-01	R\$ 11.890.124,68	EM ANDAMENTO	79,57%



Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
<p>OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS BACIAS 11, 13 , 16 E 17, DOS BAIRROS CENTRO E PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL (PT 0222721-01). CONTRATO: 3171201/2007. EMPRESA EXECUTORA: TECNOCON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA. ORIGEM DOS RECURSOS: CAIXA ECONÔMICA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 11.254.793,99. TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 9.455.863,74 (84,02%). PRAZO CEF: 30/06/2018 PRAZO PMS: 05/04/2018 SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO</p>					
 <p>EXECUÇÃO DE CAIXAS DE SAÍDA NA LAGOA DE TRATAMENTO MATURAÇÃO I.</p>					
 <p>EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM.</p>					
 <p>ENROCAMENTO DE PEDRA EXECUTADO NA ÁREA DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS BAIRROS CENTRO E PEDRINHAS.</p>					
12	TP PMS 023/2016	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CAMPO GRANDE - CARACARÁ	R\$ 139.604,42	EM ANDAMENTO	100,00%


Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
13	TP 029/2016 SEBRAS CPL	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE OITICICA EM ARACATIAÇU	R\$ 120.384,85	EM ANDAMENTO	100,00%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
41	003/2014	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO, CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF. PT 0406607-26 NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	: R\$ 3.641.075,71.	EM ANDAMENTO	37,27%
 <p data-bbox="680 1419 1295 1444">CONCRETAGEM DA PAREDE EXTERNA DO POÇO AMAZONAS.</p>  <p data-bbox="219 1705 1474 1764">ADUTORA -ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DE DIÂMETRO 500 MM.</p>					

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
41	003/2014	AMPLIACAO DA ETA DOM EXPEDITOPT 0406607-26 NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	R\$ 2.995.179,36	PARALISADAS	46,70%
 <p>CONCRETAGEM DAS PAREDES DO DECAANTADOR E FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.</p>  <p>EXECUÇÃO DE COBERTA DO LEITO DE SECAGEM.</p>  <p>EXECUÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DA INTERLIGAÇÃO DO DECAANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM E A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.</p>					
18	0062013-2	IMPLANTACAO DE REDE DE MICRO-DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SOBRAL CE (DRENAGEM CANAL MUCAMBINHO)	R\$ 3.580.628,34	EM ANDAMENTO	66,91%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
<p>OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA MICRO BACIA DO CANAL DO MUCAMBINHO (LOTE 02) CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES PT 0292724-02.</p> <p>CONTRATO: 006/2013-SEBRAS/CPL.</p> <p>EMPRESA EXECUTORA: MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA.</p> <p>ORIGEM DOS RECURSOS: CAIXA ECONÔMICA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.</p> <p>VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 3.211.680,93.</p> <p>TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 2.763.514,12 (86,05%).</p> <p>PRAZO CEF: 30/09/2018</p> <p>PRAZO PMS: 27/06/2018</p> <p>SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO</p>					
					
<p>EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CANAL DO MUCAMBINHO.</p>					
					
<p>EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CANAL DO MUCAMBINHO.</p>					
					
<p>PASSEIO EXECUTADO NA ÁREA DO CANAL DO MUCAMBINHO.</p>					

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
Obras Municipais - Recursos Próprios					
ITEM	CONTRATO Nº	OBJETO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO
	TP 047/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AMPLIAÇÃO DE RDE DE DRENAGEM NA RUA DAS FLORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, REF AO TP 047/2016.			
<p>OBJETO DA OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA RUA DAS FLORES – IPUEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONTRATO: 023/2017 – SECOMP. EMPRESA EXECUTORA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME. ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 18.631,89. TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 14.280,41 (76,64%). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/04/2018 PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/03/2018 SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO</p>					
			ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DA REDE DE DRENAGEM.		
			EXECUÇÃO DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM - CAIXA GRELHADA .		

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
78	TP 049/2016	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA ÁREA DA ETE - CENTRO E PEDRINHAS	R\$ 91.299,26	EM ANDAMENTO	32,62%
					
7	CP 013/2015 SEBRAS CPL	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ARACATIAÇU	R\$ 811.606,91	EM ANDAMENTO	29,81%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
------	-------------	--------	------------------------------	--------	------------

OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SUB –BACIA-RESIDENCIAL 1, DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL.

CONTRATO: 013/2015 - SEBRAS/CPL.

EMPRESA EXECUTORA: ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.

ORIGEM DOS RECURSOS: Prefeitura Municipal de Sobral.

VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 811.256,99.


TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 302.104,33 (37,24%).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 22/07/2018

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



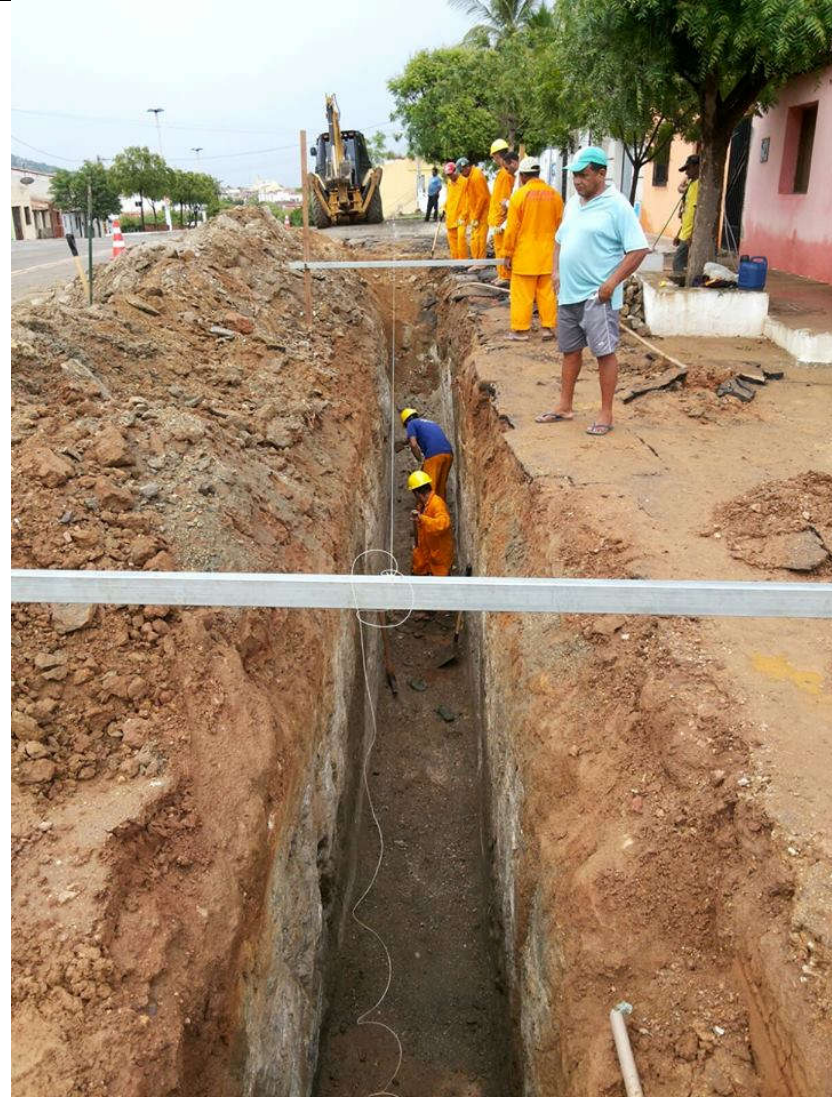



Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
8	016/2016 SE-BRAS CPL	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAIBARAS	R\$ 230.770,79	EM ANDAMENTO	57,08%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
10	TP 024/2016 PMS	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - OLHO D'ÁGUA DO PAJÉ	R\$ 45.999,78	EM ANDAMENTO	100,00%
					
11	TP 023/2016 PMS	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FAZENDA DA MUTUCA	R\$ 28.545,57	EM ANDAMENTO	100,00%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
REFORMAS - Recursos Próprios					
ITEM	CONTRATO Nº	OBJETO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO
91	TP 003/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DO PONTILHÃO, SITUADO NO DISTRITO DE PEDRA BRANCA	R\$ 19.730,80	EM ANDAMENTO	100,00%
					
90	TP 002/2017	SERVIÇOS DE PINTURA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DAS PASSARELAS METÁLICAS DAS PONTES QUE CRUZAM O RIO OITICICA	R\$ 35.363,05	EM ANDAMENTO	100,00%
					
93	TP 011/2017	PINTURA DOS PILARES E DAS COBERTAS DO BECO DO COTOVELO	R\$ 33.687,39	EM ANDAMENTO	65,00%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
94	TP 013/2017	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02 - SOBRAL/CE	R\$ 875.700,00	EM ANDAMENTO	33,98%
 <p>ARMADURA DA PONTE</p>					

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
95	CP 012/2016	QUADRA COBERTA SALGADO DOS MACHADOS	R\$ 494.346,00	EM ANDAMENTO	0,00%
96	TP 012/2017	EXECUÇÃO DA PINTURA DOS BANCOS E LIXEIRAS DO PASSEIO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO	R\$ 11.045,90	EM ANDAMENTO	100,0%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
99	TP 014/2017	REFORMA DA PRAÇA VITÓRIA - BAIRRO EXPECTATIVA	R\$ 336.581,58	EM ANDAMENTO	70,00%
					
82	TP 004/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ARQUITETÔNICA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA PRAÇA DOM JERÔNIMO, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 478.331,02	CONCLUÍDO	0,00%
					

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
83	TP 007/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES - BAIRRO JUNCO	R\$ 150.503,13	CONCLUIDO	
85	TP 006/2017	REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, COM SEDE NA AV. LÚCIA SABÓIA, Nº 215 - CENTRO SOBRAL/CE	R\$ 60.187,08	CONCLUIDO	0,00%

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
					
	TP 017/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRACA DO ASSENTAMENTO EMASA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM TP 017/2017-SECOMP/CPL	R\$ 98.823,11	CONCLUÍDO	100%
					

Item	Contrato Nº	Objeto	Valor do contrato atualizado	Status	% Execução
	RP003/2017	MMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM CONTRATO RP003/2017-SECOMP/20150002-DAE.	R\$ 500.000,00		

Tabela 13: Obras

É também responsável pela fiscalização de obras que tem como objeto, dentre outros:




- Postos de saúde (PSF), U.P.A, academias ao ar livre, bem como sua manutenção;
- Escolas de Tempo Integral, C.E. I (Centro de Educação Infantil), Escolas de 12 Salas e 6 salas, padrão FNDE, e implantação de quadras esportivas em escolas do Município, bem como sua manutenção;
- Construção e manutenção dos cemitérios do Município;
- Construção de praças, parques e áreas de lazer para população;
- Construção de quadras esportivas comunitárias;
- Construção de campos esportivos comunitários;
- Centros de comércio popular;
- Galpões de feira livre.




Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
1	TP 022/2016	SEDUC	CEI COHAB II - TIPO B	R\$ 1.066.865,88	CONCLUIDA	100,00%



Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
2	CP021/2016	SEDUC	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA JACYRA PIMENTEL GOMES (BAIRRO SINHÁ SABÓIA) LOTE 1	R\$ 598.764,14	CONCLUÍDA	100,00%
						
3	005/2015	SE-DUC	ESCOLA 12 SALAS COHAB III	R\$ 6.265.707,77	CONCLUÍDO	100,00%
						

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
4	CP021/2013	SE-DUC	ESCOLA 06 SALAS DISTRITO CARACARÁ	R\$ 1.200.530,73	CONCLUÍDO	100,00%
			 			
5	021/2015	SE-DUC	CEI COLINA DA BOA VISTA	R\$ 1.637.055,93	PARALISADO	30,00%
6	CP022/2015	SE-DUC	CEI NOVA CAIÇARA (ORGULHO TROPICAL I)	R\$ 1.642.070,51	PARALISADO	19,46%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
7	CP023/2015	SE-DUC	CEI NOVA CAIÇARA (ORGU-LHO TROPICAL II)	R\$ 1.968.067,24	PARALISADO	5,19%
8	024/2015	SE-DUC	CEI NOVA CAIÇARA (ORGU-LHO TROPICAL IV)	R\$ 2.145.233,88	EM ANDAMENTO	80,05%
						


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
9	CP008/2015	SE-DUC	CONSTRUÇÃO ESCOLA 6 SALAS - PATRIARCA	R\$ 4.467.727,97	EM ANDAMENTO	19,20%
 <p>SALAS DE AULAS, LABORATÓRIOS E ADMINISTRATIVO</p>  <p>FACHADA DA ESCOLA</p>  <p>BLOCO DE SALAS DE AULA</p>						
10	CP007/2015	SE-DUC	CONSTRUÇÃO ESCOLA 6 SALAS - RAFAEL ARRUDA	R\$ 4.659.703,70	EM ANDAMENTO	29,08%


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FACHADA DA ESCOLA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>REFEITÓRIO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>BIBLIOTÉCA</p> </div> </div>						
11	CP019/2013	SE-DUC	ESCOLA 12 SALAS JAIBARAS	R\$ 3.888.032,18	EM ANDAMENTO	79,67%




Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
12	CP005/2014	SE-DUC	ESCOLA 12 SALAS JORDÃO	R\$ 3.463.010,32	EM ANDAMENTO	69,52%
						
13	CP 006/2015	SE-DUC	ESCOLA 12 SALAS TAPERUABA	R\$ 5.180.301,03	EM ANDAMENTO	13,73%
<p>OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, EM TEMPO INTEGRAL - PADRÃO SEDUC/FNDE - CEARÁ, NO DISTRITO DE TAPERUABA. CONTRATO: 006/2015-SEDUC/CPL. EMPRESA EXECUTORA: GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA. ORIGEM DOS RECURSOS: CAIXA ECONÔMICA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 5.501.678,83. TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 896.799,15 (16,30%). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/08/2018 PRAZO DE EXECUÇÃO: 20/07/2018 SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO</p>						



Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
14	CP 009/2015	SE-DUC	ESCOLA 6 SALAS TEMPO INTEGRAL DISTRITO PATOS	R\$ 3.735.887,20	PARALISADA	17,61%
						
15	019/2015	SE-DUC	ESCOLA EF FUNDAMENTAL - FNDE - APRAZÍVEL	R\$ 2.454.623,51	Paralisada	20,00%


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
Obra Paralisada						
16	028/2015	SE-DUC	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ORGULHO TROPICAL - NOVA CAIÇARA -TERRENOS NOVOS	R\$ 7.779.507,23	EM ANDAMENTO	43,79%


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
17	CP002/2015	SE-DUC	ESCOLA 06 SALAS COHAB II	R\$ 831.813,54	EM ANDAMENTO	0,00%
Sem execução em 2017						
18	CP010/2015	SE-DUC	ESCOLA 6 SALAS TEMPO INTEGRAL DISTRITO BONFIM	R\$ 4.198.563,63	EM ANDAMENTO	54,44%
						


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
19	009/2015	SE-DUC	ESCOLA 6 SALAS TEMPO INTEGRAL LOCALIDADE DE PATOS		PARALISADA	17,39%
Última Execução em 2016						
SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
Nº	Processo Licitatório	Gestora do Contrato	Objeto do Contrato	VALOR DO CONTRATO	STATUS	% EXECUÇÃO
1	TP 011/2015	SECJEL	MINI ESTÁDIO NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, DISTRITO DE JORDÃO - PT Nº 1011071-81	R\$ 480.645,22	EM ANDAMENTO	95,03%
						
2	TP 012/2015	SECJEL	MINI ESTÁDIO NA LOCALIDADE DE RECREIO, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA	R\$507.980,04	EM ANDAMENTO	98,32%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
3	TP010/2015	SECJ EL	MINI ESTÁDIO NO BAIRRO TAMARINDO - PT Nº 1011070-66	R\$ 344.963,88	EM ANDAMENTO	59,52%
						
3	TP 009/2016	SECJ EL	COBERTURA DA QUADRA EM RAFAEL ARRUDA	R\$ 304.962.60	EM ANDAMENTO	80,00%
						

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
4	CP 011/2016	SECJ EL	QUADRA COBERTA DIS- TRITO DE BARACHO	R\$ 548.95 5,64	EM ANDA- MENTO	30,49%
						
5	CP 008/2016	SECJ EL	QUADRA COBERTA DIS- TRITO DE OURO BRANCO	R\$ 576.67 3,88	CONCLUIDA	100,00%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
6	CP004/2016	SECJ EL	QUADRA COBERTA DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO	R\$ 570.09 8,37	EM ANDAMENTO	72,24%
						

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
7	CP 003/2016	SECJ EL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO NOVO RECANTO.	R\$ 478.331,02	EM ANDAMENTO	6,94%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
8	002/2016	SECJ EL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL.	R\$470.282,77	EM ANDAMENTO	0,00%
10	CP 010/2016	SECJ EL	QUADRA COBERTA DISTRITO DE PATOS	R\$ 563.086,99	EM ANDAMENTO	22,70%
						
11	CP 012/2016	SECJ EL	QUADRA COBERTA SALGADO DOS MACHADOS	R\$ 494.346,00	EM ANDAMENTO	17,25%



Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
	2017280701	SECJEL	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL - DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE	R\$ 249.602,66	EM ANDAMENTO	5,06%

CONTRATO: 2017280701-SECJEL.

EMPRESA EXECUTORA: MODULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.

ORIGEM DOS RECURSOS: CAIXA ECONÔMICA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.

VALOR DO CONTRATO ATUAL: R\$ 249.602,66.

TOTAL EXECUTADO ATÉ O PERÍODO: R\$ 12.634,60 (5,06%).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/07/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/03/2018


SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
ITEM	CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	STATUS	% EXECUÇÃO
1	CP 018/2016	SESA	CONSTRUÇÃO DE UBSF - SANTO ANTONIO	R\$610.744,42	CONCLUÍDA	100,00%
	012/2013	SESA	CONSTRUÇÃO DE CSF - CAIOCA	R\$ 755.780,85	EM ANDAMENTO	100,00%
	004/2016	SESA	CONSTRUÇÃO DE UBSF - ALTO DA BRASILIA	R\$433.161,34	CONCLUÍDO	100,00%
	CP 016/2016	SESA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - VILA UNIÃO	R\$213.076,02	CONCLUÍDO	100,00%


Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
  						
	CP 007/2013	SESA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS PADRE PALHANO	R\$477.793,64	CONCLUÍDO	100,00%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
	PE 020/2017	SESA	INSTALAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÃO DE GRADIS E PORTÕES NOS EQUIPAMENTOS URBANOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$96.713,46	EM ANDAMENTO	100,00%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
2	CP015/2015	SESA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE ADULTO	R\$ 697.882,58	EM ANDAMENTO	80,00%
						
3	016/2016	SESA	CONSTRUÇÃO DE UBSF- ESTAÇÃO	R\$365.710,62	EM ANDAMENTO	100,00%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
 						
4	052/2017	SESA	CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES	R\$950.604,52	EM ANDAMENTO	62,64%
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato		Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
ITEM	CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	STATUS	% EXECUÇÃO	
1	TP 034/2016	STDE	Construção de um abrigo para dessalinizador no Assentamento em Campo Grande, Distrito de Caracará, no Município de Sobral/CE	R\$34.542,75	CONCLUIDA	100,00%	
							
2	CP 016/2014	STDE	CONSTRUÇÃO UADAF	R\$502.984,23	CONCLUIDA	100,00%	
							
3	025/2016	STDE	GALPÃO FEIRA LIVRE - NOVA CAIÇARA	R\$345.186,59	CONCLUIDA	100,00%	

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
4	TP 035/2016	STDE	Construção de um abatedouro de aves com capacidade de 500 aves por dia, no Município de Sobral/CE	R\$124.219,76	EM ANDAMENTO	95%
						
5	054/2015	STDE	SINALIZAÇÃO TURISTICA	R\$172.288,00	EM ANDAMENTO	14,65%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
  						
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
ITEM	CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO
1	001/2017	SEUMA	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO GERARDO CRISTINO - PRAÇA SANTO ANTÔNIO - LOTE I	R\$232.100,46	EM ANDAMENTO	42,13%

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
						
2	TP 011/2017	SEUMA	CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA NA LOCALIDADE DE VILA MALHADINHA - DISTRITO DE BONFIM	?	EM ANDAMENTO	0,00%
						
2	033/2016	SEUMA	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SERTOTE DO PIABA - SOBRAL/CE	R\$ 76.072,72	EM ANDAMENTO	95,00%
						

Nº	Processo Licitatório	Gestora Do Contrato	Objeto d Contrato	Valor do contrato	Status	% Execução
3	CP 006/2017	SEU MA	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CORAÇÃO DE JESUS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	R\$ 3.242.404,4	EM ANDAMENTO	30,00%
						

Tabela 14: Obras 2

6.1.15 SIGSECOMP

Sobral foi o primeiro Município do Estado do Ceará a implantar o Sistema Integrado de Gestão de Obras – SIGSECOMP, um sistema que até agora só era utilizado nos órgãos do Governo do Estado.

O SIGSECOMP é um sistema, no qual as empresas contratadas podem incluir medições de execução de obras on-line, no sítio eletrônico www.sobral.ce.gov.br, ficando a informação disponível e podendo ser acompanhadas a qualquer hora e local pelos gestores do contrato e pelas contratadas, inclusive permitindo a validação das medições pelo fiscal.

Tal ferramenta permitirá também o acompanhamento da fiscalização mensal, assim como a execução dos aditivos ao contrato (vigência e/ou execução) e em caso de atrasos permitirá a realização de notificação a fim de garantir informar aos gestores dos contratos sobre o status das obras.

A implantação do SIGSECOMP eleva o sistema de execução de obras do Município de Sobral a outro patamar em virtude da celeridade e transparência que se dará na condução dos Contratos sob sua responsabilidade.

Por fim, o sistema permitirá ao Secretário da SECOMP e ao Prefeito Municipal o acompanhamento dos Contratos com a impressão de relatórios, que informam a quantidade de obras cadastradas, status atualizado, valores contratuais, aditivos, prazos de execução e vigência, comissão de fiscalização, bem como o acompanhamento de todas as medições atestadas pelo setor de fiscalização da Secretaria.

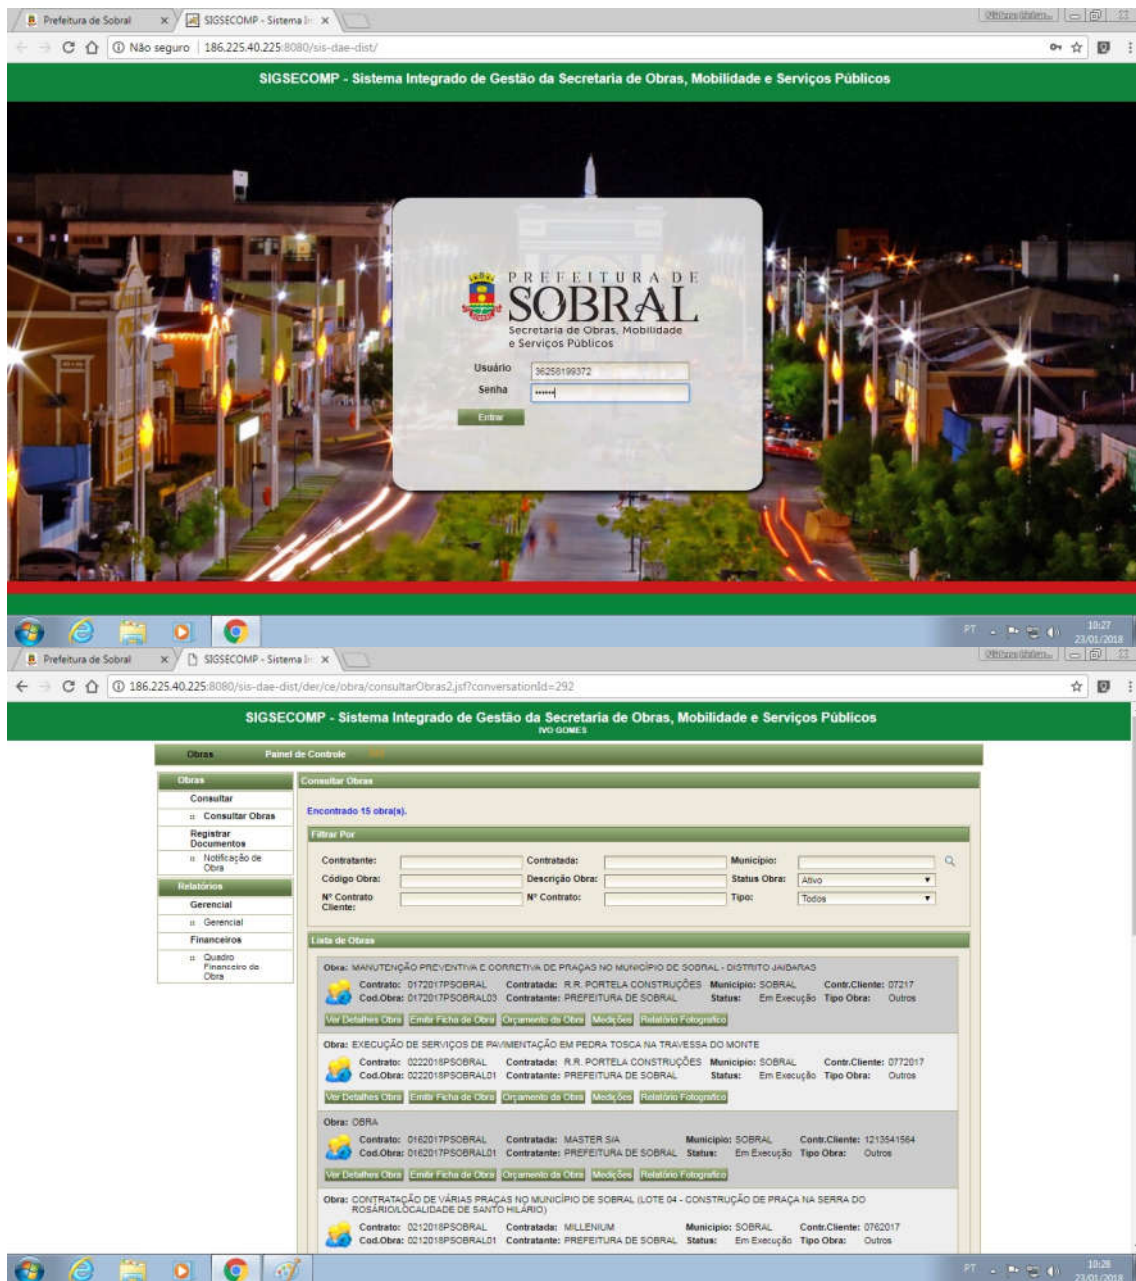


Figura 15: Telas do SIGSECOMP

6.2 SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

6.2.1 Orçamento autorizado, por fonte

Fonte	Orçamento Inicial (R\$)	Créditos Adicionais/Suplementares Autorizados	Orçamento Final (R\$)	Acréscimo (%)
Tesouro	R\$ 50.228.444,68	R\$ 15.069.335,45	R\$ 1.240.564,69	30 %
Outras Fontes				
TOTAL	R\$ 50.228.444,68	R\$ 15.069.335,45	R\$ 1.240.564,69	30 %

Tabela 15: Orçamento autorizado, por fonte

6.2.2 Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza de Despesa

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
Manutenção e funcionamento administrativo da SECOMP	R\$ 8.947.279,07	R\$ 7.287.613,85	R\$ 7.144.164,23
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas de Pessoal (Servidores Efetivos e Comissionados)	R\$ 3.440.575,33	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.068.510,51
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	R\$ 708.358,25	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas (ex-servidores da Sec.)	R\$ 65.171,59	R\$ 62.854,60	R\$ 62.854,60
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (Servidores cedidos a Secomp)	R\$ 396.610,44	R\$ 396.605,30	R\$ 396.605,30
3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Pagamento de estagiários)	R\$ 50.590,00	R\$ 6.108,96	R\$ 6.108,96
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – Material do Adm / (Mat. Exp. e Higiene / Epi's /Água /Gás)	R\$ 180.000,00	R\$ 42.467,87	R\$ 42.567,87
33.90.34.00 - Outras Despesas De Pessoal Decorrente De Contratos De Terceirização – (Mão de Obra Terceirizada – Administrativo)	R\$ 2.989.638,52	R\$ 3.032.308,88	R\$ 2.988.950,53
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Administrativo (Loc. De Veículos / Contas de Custeio: COELCE/SAAE/CAGECE/TELEMAR, Taxas Administrativas)	R\$ 623.097,13	R\$ 630.199,00	R\$ 611.497,22
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias Contributivas	R\$ 80.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores - Adm (Taxas / Contas/serv. prestados)	R\$ 53.378,16	R\$ 12.480,54	R\$ 12.480,54
3.3.90.93.00 – Indenização e Restituições - (Ress. De Convênios)	R\$ 64.300,00	R\$ 63.210,30	R\$ 63.210,30
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente (Equipamentos p/ uso de servidores)	R\$ 72.712,56	R\$ 1.764,60	R\$ 1.764,60
4.4.90.93.00 – Indenização e Restituições - (Ress. De Convênios)	R\$ 222.847,09	R\$ 219.613,80	R\$ 219.613,80
Usina de asfalto	R\$ 3.427.700,90	R\$ 3.297.598,61	R\$ 2.982.950,47
33.90.34.00 - Outras Despesas De Pessoal Decorrente De Contratos De Terceirização – (Mão de Obra Terceirizada)	R\$ 87.000,00	R\$ 86.403,17	R\$ 86.403,17
33.90.30.00 - Material De Consumo – (Ferramentas / Insumos E Betuminoso Para Pavimentação)	R\$ 2.641.794,05	R\$ 2.616.774,32	R\$ 2.388.049,55
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Locação de Onibus e Máquinas pesadas /Serv. de Reparos de Equipamentos)	R\$ 698.906,85	R\$ 594.421,12	R\$ 508.497,75
Modernização, manutenção e aquisição de máquinas e veículos	R\$ 587.972,55	R\$ 205.842,75	R\$ 201.798,73
33.90.30.00 - Material De Consumo – (Combustível de máquinas e Veículos da Secomp)	R\$ 387.972,55	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Taxas de Licenciamentos de Veículos)	R\$ 100.000,00	R\$ 2.202,75	R\$ 1.798,73
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - (Aquisição de G.P.S)	R\$ 100.000,00	R\$ 3.640,00	R\$ 0,00
Capacitação de servidores	R\$ 17.471,20	R\$ 3.042,00	R\$ 3.042,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Curso de Capacitação)	R\$ 17.471,20	R\$ 3.042,00	R\$ 3.042,00
Rodovias e estradas vicinais	R\$ 100.000,00	R\$ 56.002,45	R\$ 56.002,45

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Serviços de Manutenção)	R\$ 100.000,00	R\$ 56.002,45	R\$ 56.002,45
Avenidas e ruas	R\$ 2.097.000,00	R\$ 480.182,20	R\$ 480.182,20
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Obras de Pavimentação e Recuperação)	R\$ 1.600.000,00	R\$ 33.629,71	R\$ 33.629,71
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.22 – Fonte Estadual (Obras de Pavimentação e Recuperação)	R\$ 400.000,00	R\$ 338.348,02	R\$ 338.348,02
4.4.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores - 01.01.01 – Fonte Municipal (Reconhecimento de Dividas)	R\$ 15.000,00	R\$ 13.290,15	R\$ 13.290,15
4.4.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores - 01.01.18 – Fonte Federal(Reconhecimento de Dividas)	R\$ 58.000,00	R\$ 71.245,95	R\$ 71.245,95
4.4.90.93.00 – Indenização e Restituições - 01.01.18 – Fonte Federal (Reconhecimento de Dividas)	R\$ 24.000,00	R\$ 23.668,37	R\$ 23.668,37
Desenvolvimento da infraestrutura	R\$ 3.707.000,00	R\$ 1.039.568,00	R\$ 1.020.436,79
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (serviços de Topografia e Taxas de Conv.)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.680,00	R\$ 6.480,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Obras de desenvolvimento)	R\$ 1.895.000,00	R\$ 224.117,23	R\$ 205.485,34
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 1.01.18 – Fonte Federal(Obras de desenvolvimento)	R\$ 695.000,00	R\$ 691.850,77	R\$ 691.551,45
4.4.90.93.00 – Indenização e Restituições - 01.01.01 – Fonte Municipal (Despropriações)	R\$ 117.000,00	R\$ 116.920,00	R\$ 116.920,00
Recuperação de Avenidas e Ruas	R\$ 2.370.000,00	R\$ 900.480,64	R\$ 900.480,64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Serviços de Reformas e Recuperação de Ruas, Placas de Sinalização, Taxas de Linceamentos)	R\$ 370.000,00	R\$ 360.529,15	R\$ 360.529,15

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Obras de Obras de Pavimentação em Pedra Tosca e revestimento asafaltico)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 86.112,20	R\$ 86.112,20
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.22 – Fonte Estadual (Obras de Obras de Pavimentação em Pedra Tosca e revestimento asafaltico)	R\$ 500.000,00	R\$ 327.884,44	R\$ 327.884,44
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 1.01.18 – Fonte Federal(Obras de Pavimentação em Pedra Tosca e revestimento asafaltico)	R\$ 400.000,00	R\$ 125.954,85	R\$ 125.954,85
Manutenção e modernização da rede de energia elétrica	R\$ 10.948.744,32	R\$ 10.480.452,67	R\$ 9.870.184,58
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Serviços de manutenção de Rede Elétrica do Município / Repasse de Arrecadação da CIP / Serviços de Substituição de Luminárias de LED)	R\$ 10.948.744,32	R\$ 10.480.452,67	R\$ 9.870.184,58
Manutenção de rodovias e estradas vicinais	R\$ 1.203.000,00	R\$ 753.949,88	R\$ 640.714,01
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Locação de Maquinas Pesadas)	R\$ 1.203.000,00	R\$ 753.949,88	R\$ 640.714,01
Melhoria da Limpeza Pública	R\$ 15.295.630,53	R\$ 15.135.673,10	R\$ 14.766.515,80
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (Material e Ferramentas para Limpeza Urbana do Município)	R\$ 176.711,96	R\$ 160.609,50	R\$ 160.609,50
33.90.34.00 - Outras Despesas De Pessoal Decorrente De Contratos De Terceirização – (Mão de Obra Terceirizada – Limpeza Urbana)	R\$ 10.885.348,86	R\$ 10.793.189,53	R\$ 10.713.840,92
33.90.36.01 -Pessoa Física/Locação de Imóveis - (Locação de Imóvel para funcionamento do Galpão de Triagem de Taperuaba)	R\$ 9.882,72	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
3.3.90.36.02 –Pessoa Física/ Frete - (Locação de Caminhões de Limpeza Urbana)	R\$ 952.580,60	R\$ 797.175,21	R\$ 762.000,46

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (locação de Caminhões Caçamba,Caminhões Carroceteria Aberta, Onibus,Compactadores de Lixo e Maquinas pesadas dest. A Limpeza pública)	R\$ 3.271.106,39	R\$ 3.378.098,86	R\$ 3.123.464,92
Modernização e manutenção dos equipamentos de limpeza urbana	R\$ 1.570.111,84	R\$ 1.186.650,00	R\$ 1.126.569,09
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (Combustível de Maquinas e Veículos próprios a Serviço da Secomp)	R\$ 1.012.386,85	R\$ 974.275,00	R\$ 966.924,83
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Serviços de Oficina de Maquina e Veiculos da Secomp)	R\$ 357.524,99	R\$ 160.000,00	R\$ 107.269,26
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - (Aquisição de 25 Máquinas Roçadeiras)	R\$ 200.200,00	R\$ 52.375,00	R\$ 52.375,00
Manutenção de equipamentos públicos e logradouros	R\$ 3.127.314,27	R\$ 2.362.821,42	R\$ 2.284.164,60
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (Material para manutenção de logradouros)	R\$ 500.000,00	R\$ 351.700,98	R\$ 351.700,98
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Manutenção de Logradouros, Reforma de Praças e Equipamentos Público,Limpeza de Lagos e Equipamentos Públicos)	R\$ 1.828.519,96	R\$ 1.682.843,12	R\$ 1.604.186,30
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Revitalização da Margem Esquerda do do rio Acarau)	R\$ 753.794,31	R\$ 14.535,43	R\$ 14.535,43
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 1.01.18 – Fonte Federal(Obras de Pavimentação em Pedra Tosca e revestimento asfaltico)	R\$ 453.794,31	R\$ 269.299,48	R\$ 269.299,48
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - (Aquisição de Equipamento de Academia para Praças do Município)	R\$ 45.000,00	R\$ 44.442,41	R\$ 44.442,41
Esgotamento Sanitário - Distritos	R\$ 898.277,05	R\$ 541.478,18	R\$ 541.478,18

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Taxas de Licenças Ambientais)	R\$ 7.757,39	R\$ 6.210,88	R\$ 6.210,88
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Const. De Ssistemas de Esgotamento sanitário do Distrito de Aracatiajú e Jaibaras)	R\$ 890.519,66	R\$ 535.267,30	R\$ 535.267,30
Esgotamento Sanitário - Sede do Município	R\$ 7.916.237,68	R\$ 3.541.642,35	R\$ 3.534.988,65
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (Material para atender serviços destinados a Esg. Sanitario na Sede)	R\$ 649.597,13	R\$ 11.280,48	R\$ 11.280,48
3.3.90.36.01 –Pessoa Física/ Autonomos(Serviços Técnicos em Saneamento)	R\$ 204.640,55	R\$ 68.747,00	R\$ 68.747,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Manutenção de Logradouros, Reforma de Praças e Equipamentos Público,Limpeza de Lagos e Equipamentos Públicos)	R\$ 100.000,00	R\$ 2.242,16	R\$ 2.242,16
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Obras de Saneamento Nos Bairros de Sobral)	R\$ 3.481.000,00	R\$ 1.817.064,65	R\$ 1.815.097,67
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 1.01.18 – Fonte Federal(Obras de Saneamento nos Bairros de Sobral)	R\$ 3.481.000,00	R\$ 1.642.308,06	R\$ 1.637.621,34
Implantação da usina de triagem de material reciclável	R\$ 57.311,43	R\$ 3.045,29	R\$ 3.045,29
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Taxas de licença ambiental e Serviços Cartorários)	R\$ 57.311,43	R\$ 3.045,29	R\$ 3.045,29
Contribuição para o consórcio de gestão integrada de resíduos sólidos	R\$ 27.415,07	R\$ 103.744,44	R\$ 103.744,44
3.3.50.41.00 - Contribuições (contrato de Rateio - COMDERES)	R\$ 27.415,07	R\$ 103.744,44	R\$ 103.744,44
Construção de adutoras e sistemas de abastecimento água	R\$ 613.176,84	R\$ 468.823,79	R\$ 468.823,79

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Construção de Sistemas de Abastecimento D'água nos Distritos)	R\$ 100.000,00	R\$ 5.301,03	R\$ 5.301,03
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 1.01.18 – Fonte Federal(Ampliação de E.T.A - Sumaré no município de Sobral e Sistemas de Abastecimento D'água nos Distritos)	R\$ 463.176,84	R\$ 414.397,53	R\$ 414.397,53
4.4.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores - 01.01.01 – Fonte Municipal (Reconhecimento de Dívidas - Base E.T.A Sumaré)	R\$ 50.000,00	R\$ 49.125,23	R\$ 49.125,23
Recuperação, manutenção da infraestrutura hídrica	R\$ 100.000,00	R\$ 5.903,63	R\$ 5.903,63
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Manutenção de Equipamentos e taxas adm)	R\$ 100.000,00	R\$ 5.903,63	R\$ 5.903,63
Manutenção modernização de adutoras e sistemas de abastecimento d'água	R\$ 300.000,00	R\$ 68.606,98	R\$ 68.606,98
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (Material para atender os equipamentos dos sistemas de Abastecimento)	R\$ 100.000,00	R\$ 4.176,00	R\$ 4.176,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Manutenção, Locação de Equipamentos e Taxas)	R\$ 100.000,00	R\$ 9.550,33	R\$ 9.550,33
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'água nos Distritos)	R\$ 100.000,00	R\$ 54.880,65	R\$ 54.880,65
Manutenção, perfuração e instalação de poços	R\$ 550.000,00	R\$ 53.144,89	R\$ 53.144,89
3.3.90.30.00 - Material De Consumo – (aquisição de material para suprir Poços dos distritos)	R\$ 100.000,00	R\$ 223,60	R\$ 223,60
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (Serviços de Manutenção de Equipamentos e Testes de Vazão)	R\$ 300.000,00	R\$ 12.323,70	R\$ 12.323,70
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.01 – Fonte Municipal(Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'água nos Distritos)	R\$ 100.000,00	R\$ 2.858,74	R\$ 2.858,74

Descrição	Lei (R\$)	Lei + Créditos (R\$)	Empenhados (R\$)
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - 01.01.22 – Fonte Estadual (Construção de Poços e Chafarizes nos Distritos de Sobral)	R\$ 50.000,00	R\$ 37.738,85	R\$ 37.738,85
Total geral	R\$ 63.861.642,75	R\$ 47.976.267,12	R\$ 46.256.941,44

Tabela 16: Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza de Despesa

6.2.3 Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos

No exercício de 2017, a **SECOMP** recebeu recursos originados de financiamentos com recursos externos, conforme abaixo:

Nº do convênio	Projeto / Programa	Valor (R\$)	Esfera do convênio
?	2501 – 15.451.0108.1219 -AVENIDAS E RUAS	338.348,02	Governo do estado
?	2501 – 15.451.0108.2313 – RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	327.884,44	Governo do estado
?	2501 – 18.544.0109.2245 – MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	37.738,85	SOHIDRA
?	2501 – 15.451.0108.2212 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	691.551,45	UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
?	2501 – 15.451.0108.2313 – RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	125.954,85	UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
?	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS E LOGRADOUROS	269.299,48	UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MINISTERIO DO TURISMO
?	ESGOTAMENTO SANITARIO – SEDE DO MUNICIPIO	1.517.373,97	UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/
?	ESGOTAMENTO SANITARIO – SEDE DO MUNICIPIO	120.247,97	UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/
?	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	149.476,81	D'NOCS/FEDERAL
0424367-92 * 682807/2014	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	264.920,72	FEDERAL
Total geral		3.842.796,56	

Tabela 17: Fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos

6.2.4 Demonstrativos das Transferências de Recursos mediante Convênio, Ajuste, Acordo, Termo de Parceria ou Outros Instrumentos Congêneres

A **Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos** transferiu / recebeu recursos mediante convênio, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, conforme abaixo:

Nº do convênio	Objeto do contrato	Investimento (R\$)	Contrapartida (R\$)	% da contrapartida
0366276-63 * 758568/2011	REESTRUTURAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS NOS BAIRROS: TAMARINDO, COHAB III E SANTA CASA.	1.189.438,55	201.838,55	16,97%
0292724-02 * 653530/2009	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BACIAS: B, G, H, P, Q, R, S, T E EXPECTATIVA.	8.841.217,86	593.395,10	6,71%
0335138-36 * 744853/2010	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	2.657.086,46	383.786,46	14,44%
0325947-16 * 735117/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	852.984,00	63.184,00	7,41%
0347730-63 * 753710/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, REVESTIMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS.	1.183.301,11	198.470,31	16,77%
0222721-01 * 594184/2007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CENTRO E PEDRINHAS.	11.518.953,99	1.053.953,99	9,15%
0406607-26 * 677381/2013	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO.	6.733.176,72	0,00	0,00%
0351172-91 * 670821/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOBRAL.	498.256,92	63.124,92	12,67%
0424367-92 * 682807/2014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL AMPLIACAO DA ETA SUMARE V	13.147.323,29	1.605.211,43	12,21%
0424415-71 * 682695/2014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS: PE. IBIAPINA, DOMINGOS OLÍMPIO E COHAB III.	21.331.574,48	683.574,20	3,20%
0424429-31 * 683219/2014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE TAPERUABA.	10.208.071,73	205.571,73	2,01%
1022179-06 * 815162/2014	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ	326.171,22	16.640,41	5,10%
0394938-47 * 674989/2012	CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO AÇÚDE AYRES DE SOUSA // ADUTORA JORDÃO	7.273.998,57	182.090,26	2,50%
1012527-83 * 797906/2013	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA BACIA DA CAPELA MÃE RAINHA	1.427.430,03	340.930,03	23,88%
1034635-39 * 834852/2016	REFORMA DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	412.951,61	18.751,61	4,54%

Nº do convênio	Objeto do contrato	Investimento (R\$)	Contrapartida (R\$)	% da contrapartida
1035370-07 * 837708/2016	AQUISIÇÃO DE 02 ETAS MODULADAS PARA AMPLIAÇÃO DA ETA IV	588.571,00	22.285,00	3,79%
033/2013***	Abastecimento d'água em Aracatiaçu e Caracará. (Água Para Todos) DNOCS	510.000,00		
990126 = 067/2016	Pavimentação em Pedra Tosca	875.000,00		
Total Geral		89.575.507,54	5.632.808,00	6,29%

Tabela 18: Fluxo financeiro de recursos recebidos ou transferidos (convênios federais)

Nº do convênio	Objeto do contrato	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Acumulado (R\$)	% executado
0366276-63 * 758568/2011	REESTRUTURAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS NOS BAIRROS: TAMARINDO, COHAB III E SANTA CASA.	315.786,02	64.538,05	380.324,07	31,98%
0292724-02 * 653530/2009	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM - BACIAS: B, G, H, P, Q, R, S, T E EXPECTATIVA.	6.902.641,08	593.395,10	7.496.036,18	84,79%
0335138-36 * 744853/2010	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	794.261,51	133.054,23	927.315,74	34,90%
0325947-16 * 735117/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	419.457,48	33.556,61	453.014,09	53,11%
0347730-63 * 753710/2010	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, REVESTIMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS.	722.803,55	145.663,42	868.466,97	73,39%
0222721-01 * 594184/2007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CENTRO E PEDRINHAS.	8.740.221,01	879.157,46	9.619.378,47	83,51%
0406607-26 * 677381/2013	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO.	2.613.533,04	0,00	2.613.533,04	38,82%
0351172-91 * 670821/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOBRAL.	266.644,95	26.288,54	292.933,49	58,79%
0424367-92 * 682807/2014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARE V	0,00	0,00	0,00	0,00%
0424415-71 * 682695/2014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS: PE. IBIA-PINA, DOMINGOS OLÍMPIO E COHAB III.	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nº do convênio	Objeto do contrato	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Acumulado (R\$)	% executado
0424429-31 * 683219/2014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE TAPERUABA.	0,00	0,00	0,00	0,00%
1022179-06 * 815162/2014	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU	154.765,41	16.582,54	171.347,95	52,53%
0394938-47 * 674989/2012	CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO AÇUDE AYRES DE SOUSA // ADUTORA JORDÃO	68.816,87	1.766,93	70.583,80	0,97%
1012527-83 * 797906/2013	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA BACIA DA CAPELA MÃE RAINHA	0,00	0,00	0,00	0,00%
1034635-39 * 834852/2016	REFORMA DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1035370-07 * 837708/2016	AQUISIÇÃO DE 02 ETAS MODULADAS PARA AMPLIAÇÃO DA ETA IV	0,00	0,00	0,00	0,00%
033/2013***	Abastecimento d'água em Aracatiáçu e Caracará. (Água Para Todos) DNOCS	204.000,00	204.000,00	204.000,00	40,00%
990126 = 067/2016	Pavimentação em Pedra Tosca				0,00%

Tabela 19: Execução financeiro de recursos recebidos ou transferidos (convênios federais)

Atenção! Faltam os recursos estaduais.

7 CONCLUSÃO

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos seguirá no compromisso de manter as funcionalidades dos serviços prestados na melhor forma possível para atender a população sobralense, visando o crescimento da qualidade de vida do cidadão e sempre apresentando formas de melhoria e ampliação da infraestrutura, mobilidade e serviços públicos da cidade de Sobral.
